

ACTA

En la localidad de EL Bolsón a los 11 días del mes de febrero de 2020 se reúnen en la sede del Consejo Provincial de Educación – Sede Andina El Bolsón – el gremio docente Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) representado por la Sra. Claudia Ascencio, Secretaria del Area de Salud de UNTER Central, Mónica San Martín, Secretaria de la Seccional UNTER El Bolsón, Angel Quintero, Secretario Gremial, Silvana Lagos, Vocal del Consejo Directivo de Unter Central y sus letrados, el Dr. Matías Lafuente y la Dra. María Victoria Malkassian, abogada, mat. 2740 L° XI del Colegio de Abogados de SC de Bariloche y la Provincia de Río Negro (Consejo Provincial de Educación), representada por la Sra. Patricia Campos, Delegada Zona Andina Sur del Consejo Provincial de Educación, la Sra. Mercedes Telechea Subcoordinadora del Consejo Provincial de Educación Zona Andina Sur, el Ingeniero Sr. Marcelo José Pozo, representante técnico de la Provincia de Río Negro, y con la intervención del representante de la Fiscalía de Estado de Río Negro, Dr. Marcos Lucio Méndez, abogado Mat. 4175 Colegio de Abogados de SC de Bariloche, en el marco del acuerdo establecido en los autos: "UNTER Y OTRO C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ ACCION DE AMPARO COLECTIVO S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA" Expte. N° I25426/14 que tramita ante la Cámara Primera del Trabajo de SC de Bariloche. Como consecuencia de lo establecido por las partes en los escritos presentados al Tribunal con fecha 7 de febrero y 13 de abril de 2018, se realiza la presente a fin de dar seguimiento a las obras y plazos allí comprometidos por la Provincia de Río Negro. ESCUELA N° 29 Respecto de la escuela de Ñorquinco N° 29 el gremio docente manifiesta su preocupación respecto de la paralización de las obras. El Ing. Pozo informa que el jardín tiene una ampliación de obra por días caídos hasta el 29 de febrero de 2020, fecha en la cual está prevista la entrega de la obra. Falta una última certificación de obra este mes, puede que por días de lluvia se le otorgue a la empresa dos o tres días más de obra. Respecto de la obra en la escuela primaria, el Ing. Pozo informa sobre la existencia de vicios ocultos en un cielo raso que apareció luego de su demolición. La Provincia explica que luego de que se preparó la documentación complementaria respecto del vicio oculto, la misma se envió a Viedma. La Municipalidad de El Bolsón se negó a avanzar con el arreglo sin la firma del Subsecretario, lo cual demoró el avance. Simultáneamente la Municipalidad removió a la persona que estaba a cargo de esa obra y la persona que tomó la obra demoró un mes en realizar las gestiones para poder avanzar. La Provincia manifiesta que la obra del jardín está muy avanzada y es de buena calidad, amplia, alta, y con buena iluminación. La empresa que realiza la obra del jardín es Medrano

María Victoria Malkassian
Abogada
C.A.B. 2740 L° XI
F.C. 120 F. 22
Mat. 2740 L° XI

Prof. Patricia Campos

Mercedes Telechea
Subcoordinadora

Silvana Lagos
Vocal Titular

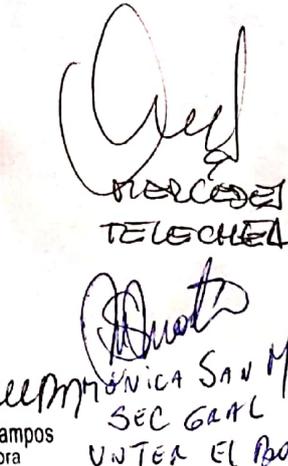
Mónica San Martín
SEC. GRAL.
UNTER EL BOLSÓN


Angel Quintero
Secretario Gremial
Un.T.E.R. El Bolsón


Construcciones. La empresa ha empleado mano de obra local para las obras que se realizan dentro de la escuela primaria. El Ing. Pozo informa que el proyecto del jardín está pronto a terminarse, pero aún no se realizó nada respecto del edificio escolar. Respecto del edificio principal, mañana el Consejo tiene una reunión con la Municipalidad para reactivar la obra y volver a planificar el trabajo. Durante este período los niños se reubican en la ESRN 110. De ser necesario en el caso de que la obra no esté terminada, una posibilidad es que las clases se dicten en forma provisoria en la residencia escolar. Para que se entregue la obra de la escuela falta la obra de gas de la escuela completa y el ensamble con el jardín. Hoy se van a firmar los planos y luego se solicitará un turno para la inspección de Camuzzi. Se va a hacer un tendido de 100 metros de cable para la instalación de la energía trifásica. La parte eléctrica nueva es toda led y está a un 90%. Faltan las veredas exteriores, las canaletas, se tiene que hacer la vereda de acceso para niños/as con capacidades diferentes, faltan soldaduras, colocación de viga, armar un cielo raso del comedor, colocar un artefacto, colocación de una puerta de salida, se va a colocar una nueva cocina Morelli Chef, lozas externas de protección a los pozos absorbentes, cámara desengrasadora, pintura y revoques externos (con esmaltes sintéticos) En una segunda etapa de la obra, se remodelará la cocina, las humedades de las aulas serán revestidas con machimbre de PVC para que las paredes suden. Y se realizará la pintura de las aulas. Se va a cubrir la entrada. Ello se va a hacer por una segunda obra complementaria cuyo proyecto se realizará lo antes posible. El comedor se va a pintar en la primera etapa. La UNTER pone de manifiesto la preocupación por la demora y el incumplimiento de los plazos no obstante las explicaciones brindadas por la Provincia ESCUELA N° 103. La UNTER expresa la necesidad de tener conocimiento sobre el origen del incendio del SUM a fines del año 2019. El Ing. Pozo explica que hubo un sobrecalentamiento de un balasto, La UNTER plantea la necesidad de realizar los controles preventivos en gas y electricidad. La Provincia manifiesta que se están haciendo recargas de matafuegos y control de su vencimiento. Que en varias escuelas se realizaron los controles de seguridad. Las clases en la escuela se han iniciado hoy. Respecto de la obra de refacción del SUM, el 1 de febrero se designó a la empresa Medrano para que realice la obra. Sin más que agregar y leída que sea la presente se suscriben cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.


Silvana Lago
Vocal Titular
Un. I.E.R.


Prof. Patricia Campos
Coordinadora


Mercedes Telechea


Mónica San Martín
SEC. GRAL
UNTER EL BOLSÓN


Angel D. Quintero
Secretario Gremial y de Org.
Un.T.E.R. El Bolsón


María Victoria Malkassi
Abogada
CAR 240 L° XI
FED 1° 20 F° 236
Mat E 30 F° II F° 105
